
RAPORT Z POMIARU MODULU PV, AGH SOLAR PLANE

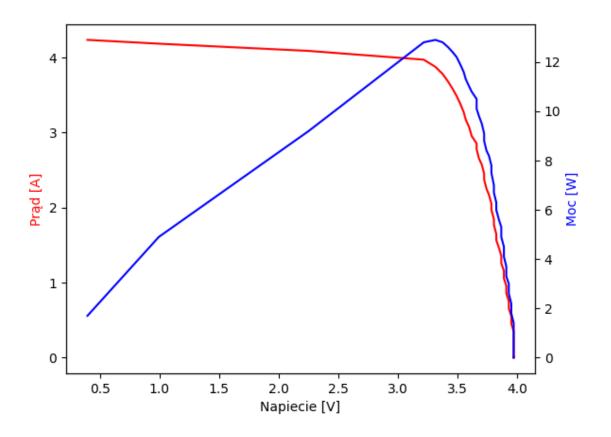

Pmmp = 12.9W Vmmp = 3.316V Immp = 3.876A Voc = 3.973V Isc = 4.236A

Sprawnosc: 20.37%

Czas trwania pomiaru: 6.78s

Warunki pomiaru

Natezenie swiatla = 690W/m2 Pole ogniwa = 153cm2 liczba ogniw = 6
