
RAPORT Z POMIARU MODULU PV, AGH SOLAR PLANE

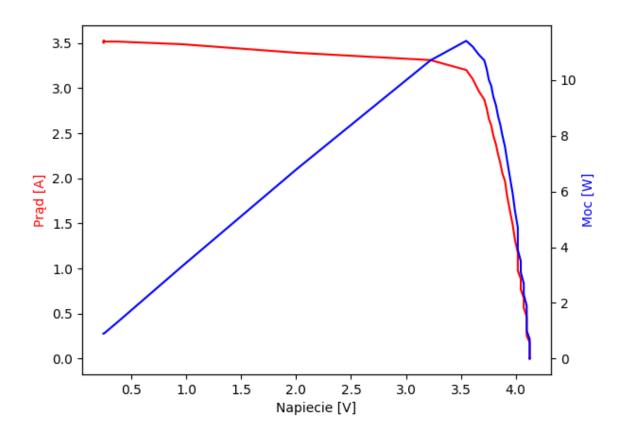

Pmmp = 11.4W Vmmp = 3.549V Immp = 3.201A Voc = 4.127V Isc = 3.509A

Sprawnosc: 12.42%

Czas trwania pomiaru: 12.84s

Warunki pomiaru

Natezenie swiatla = 1000W/m2 Pole ogniwa = 153cm2 liczba ogniw = 6
