
RAPORT Z POMIARU MODULU PV, AGH SOLAR PLANE

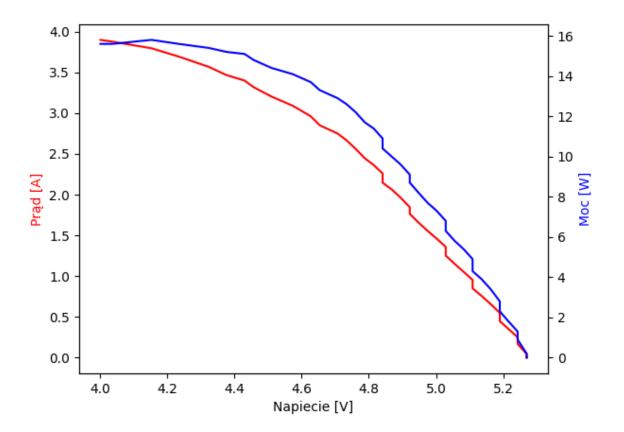

Pmmp = 15.8W Vmmp = 4.153V Immp = 3.795A Voc = 5.27V Isc = 3.898A

Sprawnosc: 17.93%

Czas trwania pomiaru: 6.81s

Warunki pomiaru

Natezenie swiatla = 720W/m2 Pole ogniwa = 153cm2 liczba ogniw = 8
